TIMPAN SI DALA PREFABRICATA TIP T5 si D5 L=5.30m

SECTIUNE LONGITUDINALA

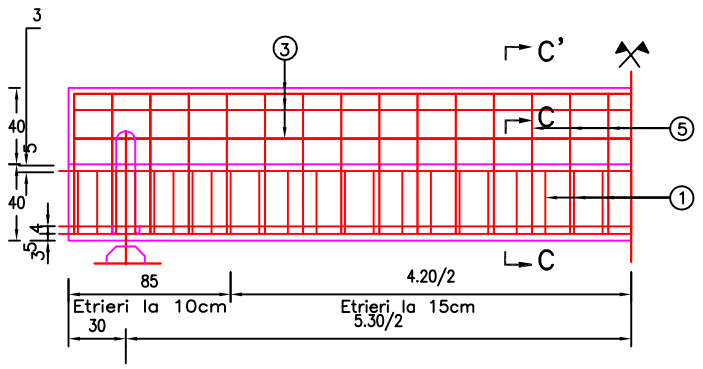

SECTIUNE C–C

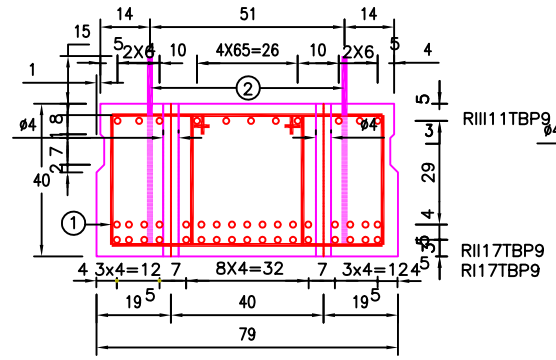

SECTIUNE C'–C

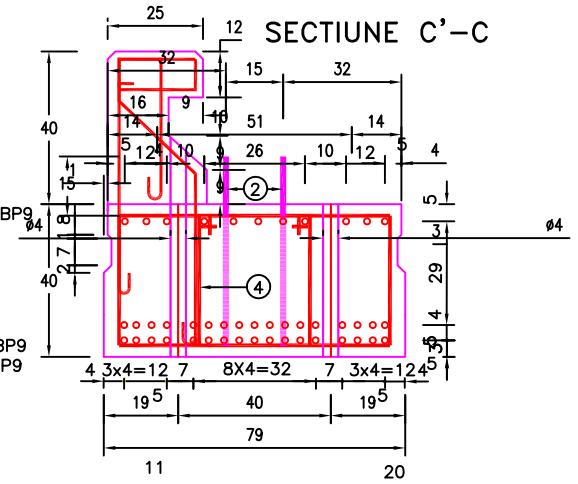

EXTRAS DE ARMATURA

TIMPAN SI DALA TIP D5 L=5.30m													
1	10	90	1.85	–	166.5	–	–	45	1.85	–	166.5	–	–
2	16	4	1.45	–	–	5.8	–	4	1.45	–	–	5.8	–
3	8	–	–	–	–	–	–	11	58	64.4	–	–	–
4	8	–	–	–	–	–	–	30	1.45	43.5	–	–	–
5	8	–	–	–	–	–	–	30	1.10	33.0	–	–	–
6	22	4	0.80	–	–	–	–	4	0.80	–	–	–	–
RII	TBP9	11	6.20	–	–	–	68.2	11	6.20	–	–	–	68.2
RI	TBP9	17	6.20	–	–	–	105.4	17	6.20	–	–	–	105.4
RI	TBP9	17	6.20	–	–	–	105.4	17	6.20	–	–	–	105.4
Lungimi /ø (m)				–	166.5	5.8	279			140.9	166.5	5.8	279
Greutati/ml (kg.)				0.395	0.617	1.578	0.390			0.395	0.617	1.578	0.390
Greutati/ø (kg.)				–	102.8	9.2	108.8			55.7	102.8	9.2	108.8
TOTAL (kg.)				112.0			108.8			167.7			108.8

CARACTERISTICI			TIPURI DE DALA
			D3 L=4.30m
CURENTA	BETON B400 (mc)		1.84
	OTEL (KG)	TBP9	108.8
		OB37	112.0
	COFRAJ (mp)		10.10
	GREUTATE (t)		4.60
MARGINALA	BETON B400 (mc)		1.84
	BETON B250 (mc)		0.52
	OTEL (KG)	TBP9	108.8
		OB37	167.7
	COFRAJ (mp)		15.80
	GREUTATE (t)		5.90



1 Etrieri ø10 OB37 L=1.85



2 Ancore 2x2 ø16 OB37



4 5ø8/ml OB37



5 5ø8/ml OB37

EFORT DE CONTROL
σpk=13.500 kg/cm2
Npk=6.68t/toron

3 øOB37

L=4.00 n=14 pentru D3.....3.85 pentru D3
L=5.00 n=11 pentru D4.....4.85 pentru D4
L=6.00 n=11 pentru D5.....5.85 pentru D5

FORTA TOTALA DE SECTIUNE

L=3.30m	L=4.30m	L=5.30
127t	214t	301t

BENEFICIAR:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)
Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.264.32.02, Fax: 021.312.09.84
CUI RO 16054368 J40/552/2004
Mail: office@andnet.ro

PRESTATOR:
S.C. TOTAL ROAD S.R.L.
Adresa: Str. Nucsoara, nr. 1, Bl.13, Ap.115 sector 6, Bucuresti
Tel: 0724.715.501; Fax: +40-35.88.15.116
CUI R 17918608 J40 / 15081 / 2005
Mail: office@totalroad.ro, web site: www.totalroad.ro

	NUME	SEMNATURA
DESENAT	Teh. Sorin VASILACHE	
PROIECTAT	Ing. Raul PUSCA	
SEF PROIECT	Ing. Catalin GRUIANU	
VERIFICAT	Ing. Catalin CARNU	
DATA: 08/2020	SCARA: 1:20 1:10 1:100	

M1				
Modif	Data	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT
Expert		Dr. Ing. Radu LUCA, Seria D Nr. 09575		
TITLU PROIECT		EXPERTIZA TEHNICA PENTRU SECTORUL DE DRUM DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, LOT 2, KM 132+435-KM 185+230		
TITLU ACTIUNE		LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA - SPECIALITATEA PODURI		
PLANSA		DETALIU TIMPAN SI DALA REFABRICATA TIP T5 SI D5		
EXEMPLAR NR. 1		FAZA PROIECT PTE	NUMAR PROIECT 22/2020	NUMAR PLANSA DET T5 - P.01

Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fara aprobarea scrisa a S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

A3 – 420x297
