COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

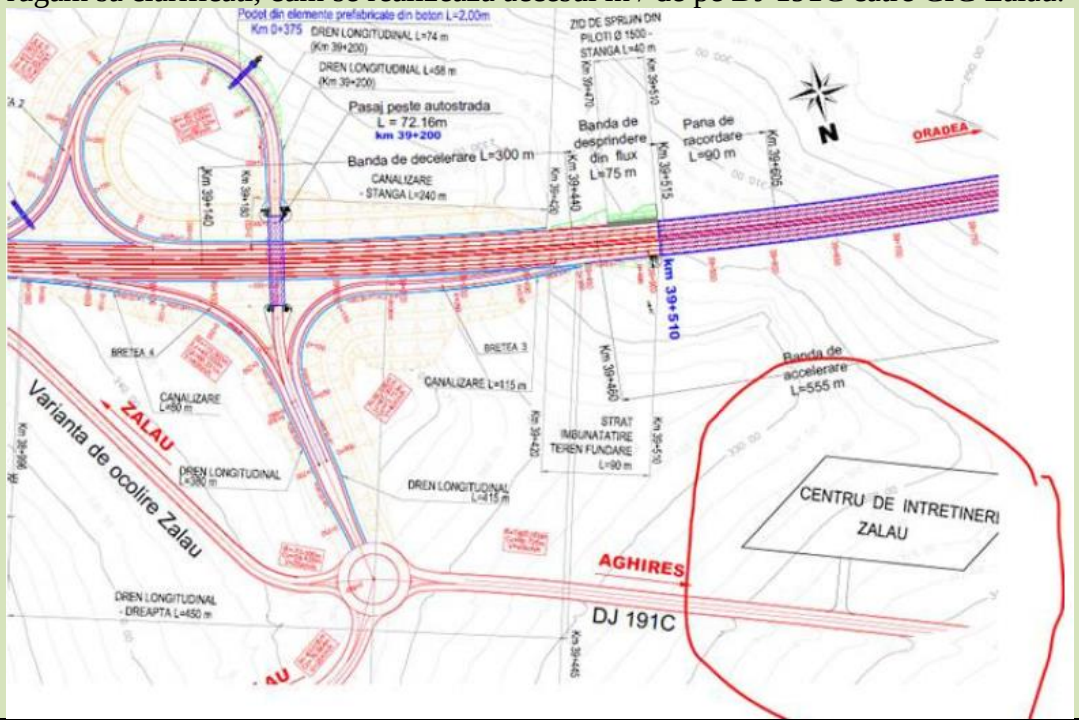
MASURI DE REMEDIERE
ADOPTATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA in cadrul
PROCEDURII DE ATRIBUIRE:
Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău

in conformitate cu prevederile Deciziei CNSC nr. 1264/C8/1179 din 07.06.2023

In conformitate cu prevederile Deciziei CNSC nr. 1264/C8/1179 din 07.06.2023, prin care s-a dispus masura de remediere cu privire la revizuirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari nr. 10, 14, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 50, 51, 79, 96, 98, 108, 109, 110, 120, 161, 170, 181, 183, 199, 216 Autoritatea Contractanta **modifica/completeaza** raspunsurile la intrebarile antementionate, din Raspunsul Consolidat publicat in SEAP prin Clarificarea nr. 1 din data de 19.04.2023, **dupa cum urmeaza**:

Intrebare 10	Ne referim la prevederile punctului 4.12.9 al Cerintelor Beneficiarului conform carora: *"Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, modificarile aduse proiectului din motive justificate si cu aprobarea beneficiarului, impun reluarea procesului de autorizare, conform legislatiei in vigoare. Toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt in responsabilitatea Antreprenorului si nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor Beneficiarului".* Prevederea sus-mentionata este discordanta cu prevederile HG1/2018, Sub-clauza 68.1 unde sunt reglementate clar si fara echivoc Riscurile Beneficiarului dintre care enumeram: *c. erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare;* *d. erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor Beneficiarului* *e. conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale* Prin urmare, conform Sub-clauzei 68.1, nu toate costurile suplimentare si intarzierile sunt in sarcina Antreprenorului, ci numai acele costuri si intarzieri care se datoreaza propriilor sale actiuni / omisiuni.

	Astfel, va rugam sa armonizati prevederile Caietului de Sarcini pentru a fi in acord cu cele ale Hotararii de Guvern pentru aprobarea conditiilor generale de contract. De asemenea, va rugam sa clarificati faptul ca, in masura in care nu sunt imputabile Antreprenorului, aceste situatii vor fi tratate potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, i.e. OUG 83/2016 sau Legea 98/2016 si normele de aplicare, dupa caz.
Raspuns 10	Prevederile articolului 4.12.9 au fost elaborate avand in vedere urmatoarele ipoteze si ratiuni: - Antreprenorul elaboreaza Proiectul Tehnic in cadrul contractelor de tip Proiectare si Executie, aceasta avand calitatea si raspunderea specifica Proiectantului. - Documentatia elaborata de Antreprenor care are si calitatea de Proiectant sta la baza obtinerii Autorizatiei de Construire; - In prealabil, tot Antreprenorul care are si calitatea de Proiectant a finalizat studierea si identificarea erorilor in Cerintele Beneficiarului, prevederile sub-clauzei 8.4, 8.5 si sub-clauzei 68.1 fiind pe deplin aplicabile, fiind finalizate la momentul obtinerii Autorizatiei de Construire si studiile de teren (inclusiv studiul geotehnic) care reflecta situatia reala din teren. - Odata obtinuta Autorizatia de Construire nu mai exista cazuri in care nu este obtinut terenul necesar realizarii constructiei, cerinte de mediu neindeplinite, sau orice alte activitati nefinalizate care tin de responsabilitatile Beneficiarului, astfel incat sa fie culpa Autoritatii Contractante care sta la baza revizuirii Autorizatiei de Construire, **dat fiind faptul ca toate aceste conditionalitati sunt necesare si se verifica la momentul emiterii Autorizatiei de Construire**. - Prin urmare, singurul scenariu in care se mai solicita revizuirea Autorizatiei de Construire are la baza initiativa/culpa Antreprenorului si poate consta in erori de proiectare, studii si calcule de proiectare eronate, modificari de solutii tehnice solicitate de catre acesta. - Intr-o atare situatie, consecintele sunt deosebit de grave si pot conduce chiar si la revizuirea Acordului de Mediu putand genera astfel intarzieri in finalizarea obiectivului de investitii, precum si costuri suplimentare, **motiv pentru care se prezinta ca fiind firesc ca Antreprenorul sa raspunda in conformitate cu prevederile legale si contractuale pentru intarzieri generate din initiativa/culpa sa**. Totusi, precizam faptul ca, in cazul in care situatiile ivite in cursul implementarii contractului vor atrage incidenta prevederilor sub-clauzei 68.1 din HG nr. 1/2018 **acestea vor fi pe deplin respectate de catre Beneficiar**.
Intrebare 14	Avem in vedere prevederile punctului 5.1.1 al Cerintelor Beneficiarului conform caruia caracteristicile imperative ale Lucrarilor includ limitele santierului. Astfel, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor coridorul de expropriere in format dwg. De asemenea, va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest coridor.
Raspuns 14	Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor culoarul expropiat in format dwg – a se vedea in acest sens Documentele Beneficiarului, dupa cum urmeaza: - folderul *Subsectiunea 3B3 - 12. Limite de Teren si Identificarea Proprietarilor;* - folderul *Subsectiunea 3B4 - 11. Limite de Teren si Identificarea Proprietarilor.* In ceea ce priveste stadiul procedurii de expropriere, Autoritatea Contractanta precizeaza ca aceasta a fost finalizata, fiind realizate toate exproprierile care fac obiectul limitelor santierului. Astfel, la acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. A se vedea totodata si Raspunsul nr. 96 si nr. 98 din prezenta Clarificare.
Intrebare 30	Facem referire la documentatia de atribuire cu privire la amplasarea CIC de la nodul rutier Zalau. Conform pieselor desenate, CIC-ul este amplasat la iesirea din intersectia giratorie pe

	DJ191C. In urma vizitei in teren am constatat ca CIC Zalau este amplasat in proximitatea DJ 191C (drum care a fost recent reabilitat) care are o declivitate de aproximativ 6.00% si care prezinta la urcare banda suplimentara pentru vehicule lente. Avand in vedere situatia data va rugam sa clarificati, cum se realizeaza accesul in / de pe DJ 191C catre CIC Zalau. 
Raspuns 30	Se va realiza CIC in nodul rutier Zalau in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Trebuie tinut cont de faptul ca acest proiect este de tipul Proiectare si Executie, iar viitorul Antreprenor va detine si calitatea de Proiectant. Prin urmare, precizam faptul ca Autoritatea Contractanata a lasat la latitudinea ofertantilor modalitatea de acces catre CIC Zalau, aceasta **<u>nereprezentand o Cerinta Imperativa a Autoritatii Contractante.</u>** Totusi, pentru a veni in sprijinul operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca una dintre posibilele solutii ce pot fi implementate in vederea asigurarii accesului catre CIC Zalau este chiar cea prezentata in plansa din cadrul solicitarii de clarificare, avand in vedere faptul ca aspectele invocate in intrebarea adresata de operatorul economic nu reprezinta un impediment real pentru realizarea accesului in/ de pe DJ 191C catre CIC Zalau, solutia fiind in concordanta cu normativele in vigoare.
Intrebare 31	In zona de acces a portalului de iesire din tunelul Meses, km 37+300, singura cale de acces catre portal, prin drumul forestier, este obturata de constructia Variantei de Ocolire Zalau. Va rugam sa clarificati daca constructia VO Zalau a luat in considerare pastrarea continuitatii drumului forestier, cat si gabaritele de libera trecere (gabarit vertical de min. 5.00m)
Raspuns 31	Contractul este de tipul Proiectare si Executie. Este responsabilitatea Antreprenorului de a executa lucrarile in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si de a-si asigura accesele necesare efectuarii lucrarilor. Precizam faptul ca in cadrul Contractului de proiectare si executie a Variantei Ocolitoare a Mun. Zalau au fost luate in considerare pastrarea continuitatii drumului forestier cat si a gabaritelor de minim 5m.
Intrebare 33	Facem referire la Nodul rutier Zalau, km 39+200, care face legatura dintre autostrada si DJ191C prin intermediul unei intersectii giratorii. Din documentatia de atribuire s-a constatat ca in

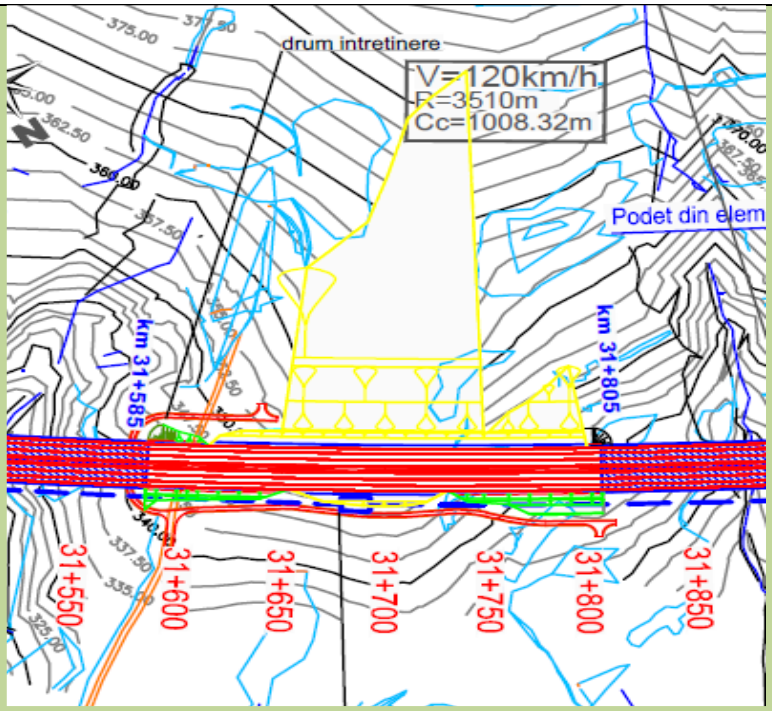
	aceasta giratie se descarca si Varianta de Ocolire Zalau. Va rugam sa clarificati daca elementele geometrice ale intersectiei giratorii au tinut cont de valorile de trafic de pe VO Zalau.
Raspuns 33	Sensul giratoriu despre care face vorbire operatorul economic in cadrul solicitarii de clarificare se executa in cadrul proiectului de executie a Centurii Ocolitoare Zalau. Astfel, acest sens giratoriu nu face obiectul prezentului contract de proiectare si executie, ci numai realizarea conexiunii la acesta. Precizam faptul ca intrucat intersectia giratorie despre care face vorbire operatorul economic in cadrul solicitarii de clarificare se realizeaza in cadrul proiectului de executie a Centurii Ocolitoare Zalau, in mod implicit, elementele geometrice ale acestei intersectii giratorii au tinut cont de valorile de trafic de pe VO Zalau, insa subliniem inca odata ca aceasta intersectie giratorie nu face obiectul prezentului Contract de proiectare si executie.
Intrebare 35	In zona km 50+500 - km 51+300, traseul autostrazii se dezvolta in interiorul zonei de inundație a Lacului Varsolt protejat si de digurile de aparare ale acestuia. Va rugam sa clarificati modul de protejare a rambleului autostrazii impotriva inundatiilor.
Raspuns 35	Modul de protejare a rambleului autostrazii impotriva inundatiilor este prevazut chiar in cadrul documentatiei tehnice pusa la dispozitie prin documentatia de atribuire. A se vedea in acest sens plansele atasate prezentelor Masuri de Remediere – Anexa nr. 1 (care se regasesc si in documentatia de atribuire publicata) care detalieaza modul de realizare a protectiei impotriva inundatiilor.
Intrebare 39	În secțiunea Cerintele Beneficiarului „3.8 Lucrari de poduri, pasaje și viaducte - Subsecțiunea 3B3” sunt indicate structurile cu deschidere >40m care includ și carucioare de inspecție pentru poduri. Lipsesc aceleași informații despre Subsecțiunea 3B4, vă rugăm să le furnizați. În plus, va rugam sa puneti la dispozitie detalii si specificatii pentru carucioarele de inspectie.
Raspuns 39	Se vor prevedea carucioare pentru inspectie, cate unul pentru fiecare pod/viaduct de pe autostrada (pe fiecare sens de circulatie) cu deschideri mai mari sau egale cu 40 m. Nu se vor prevedea carucioare pentru intretinere la lucrarile de arta care desi au o deschidere sau mai multe egala/egale cu 40 de m, au mai putin de 4 deschideri. Astfel, pentru Subsectiunea 3B4, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Structurile unde trebuie montate carucioare pentru intretinere (pe fiecare sens de circulatie) sunt urmatoarele: 1. Viaduct pe autostradă (km 41+021 - km 41+522.50); 2. Viaduct pe autostrada (km 42+186 - km 42+827.60); 3. Pod pe autostrada peste pârâul Silivaș (km 45+738.40); 4. Pod pe autostrada peste raul Crasna (km 51+566 - km 51+728.50); 5. Pod pe autostrada peste pârâul Silivaș (km 59+390.75- km 59+484.85); 6. Viaduct pe autostrada (km 62+941 - km 63+184.50); 7. Pod pe autostrada peste râul Barcău (km 65+730); A se vedea si Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare. Referitor la informatiile solicitate prin clarificare, va comunicam detaliile si specificatiile pentru carucioarele de inspectie, dupa cum urmeaza: - Latime – 1,5 m; - Lungime – trebuie sa acopere intreaga sectiune transversala a structurii; - Greutate de incarcare – 600 kg / mp; - Structura metalica; - Sa fie dotate cu sistem electric de actionare; - Caruciorul de inspectie sa fie dotat cu sine de rulare;
Intrebare 40	In documentele de licitație există o sectiune „Carucioare de inspecție”, în care sunt indicate un total de 14 carucioare de inspectie pentru subsecțiunea 3B3, insa lipsește un document cu aceleași informații despre subsecțiunea 3B4.

Raspuns 40	Autoritatea Contractanta nu detine un document similar pentru Subsectiunea 3B4 insa precizam faptul ca, se vor monta un numar de 14 carucioare de inspectie aferent Subsectiunii 3B4. A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 41	In ceea ce priveste Spatiul de Servicii S3, vă rugăm să furnizați secțiunea tip cu straturile rutiere care urmează să fie folosite pentru zona platformei, excluzând zona de parcare.
Raspuns 41	Autoritatea Contractanta nu detine o plansa cu sectiunea tip cu straturile rutiere aferente zonei platformei pentru Spatiul de servicii tip S3 (mai putin zona de parcare) insa, precizam faptul ca se va utiliza aceeasi structura rutiera ca la Autostrada.
Intrebare 50	La drumurile de intretinere, pe zona de debleu, nu este asigurata distanta de minim 3m, respectiv 5 m fata de marginea taluzului. De asemenea, in zona de rambleu, datorita faptului ca pe plan nu exista santuri, drumurile tehnologice sunt amplasate langa piciorul taluzului autostrazii. Aceste situatii sunt de natura sa genereze cu certitudine modificarea limitei de expropriere, fapt care intra in contradictie cu cerinta imperativa privind limitele santierului. In masura in care aceasta configuratie din cadrul SF nu respecta normativele in vigoare, va rugam sa clarificati daca ofertele se vor intocmi cu respectarea normativelor in vigoare sau cu respectarea limitelor santierului.
Raspuns 50	La acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. Astfel, Lucrarile proiectate in cadrul viitorului Contract se vor incadra, pe cat posibil din punct de vedere tehnic, in coridorul de expropriere aferent Studiului de fezabilitate pentru care la acest moment a fost finalizata procedura de expropriere. **Prin urmare, pentru drumurile de intretinere, pe zona de debleu se accepta si distante mai mici de 3m si respectiv 5m fata de marginea taluzului, astfel incat la momentul elaborarii ofertelor, sa fie respectate limitele santierului**. In conditiile in care, daca ulterior semnarii contractului, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie se constata faptul ca din punct de vedere tehnic este imposibila respectarea coridorului de expropriere initial de la faza de Studiu de fezabilitate, iar solutiile tehnice proiectate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, insotite de justificarile pertinente aferente demonstreaza in mod corespunzator aceasta imposibilitate, se vor aplica mecanismele contractuale si legale incidente. Totodata, precizam faptul ca, in cazul în care apar situații care necesită suprafețe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerințele Beneficiarului si Anexei nr.2 la Cerințele Beneficiarului-Suprafețe de teren suplimentare necesare execuției lucrarilor: *Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.* *Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului și doar cu acordul expres al Beneficiarului.* *In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie și/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]*. Astfel, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii

	tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare. De asemenea, se vor aplica in mod corespunzator si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).*
Intrebare 51	Referitor la accesele de intretinere prevazute la km 52+400, pe partea dreapta, respectiv stanga, va rugam sa clarificati daca pentru acestea, au fost prevazute benzi de accelerare/ decelerare, intrucat pe planul de situatie acestea nu sunt figurate.

Raspuns 51	Autoritatea Contractanta a avut in vedere la momentul elaborarii documentatiei de atribuire realizarea de benzi de accelerare/ decelerare accesele de intretinere prevazute la km 52+400, pe partea dreapta, respectiv stanga. Prin urmare, pentru elaborarea unor oferte corecte complete si comparabile, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, la momentul elaborarii acestora, in cadrul Propunerilor Tehnice si Propunerilor Financiare, se va lua in considerare faptul ca accesele pe autostrada trebuie proiectate **<u>cu benzi de accelerare/decelerare</u>**, cu incadrarea în limita coridorului expropiat pus la dispozitie de Beneficiar. Accesele de la km 52+400 sunt accese in caz de urgenta, nefiind destinate acesului public. Din acest motiv benzile de accelerare/decelerare se vor face cu incadrarea in coridorul expropiat fara a fi aplicate prevederile PD 162-2002 referitoare la lungimea benzilor de accelarare/decelerare. A se vedea si Raspunsul nr. 50 din prezenta Clarificare.
Intrebare 79	In conformitate cu prevederile Auditului de Siguranta Rutiera: 1.1 ***Analiză:*** Din memoriul tehnic rezultă că elementele geometrice de amenajare a autostrăzii, bretelele nodului rutier şi celelalte drumuri clasificate a căror traseu va fi modificat, sunt în conformitate cu prevederile PD -162/2002, ordinele MT 43/1998 şi MT45/1998, ultimele două normative fiind înlocuite la data efectuării revizuirii studiului de fezabilitate. ***Recomandare:*** La următoarea fază de proiectare se vor avea în vedere prevederile PD 162/2002, O.M..T. 1295/2017, O.M.T. 1296/2017 şi O.M.T. 1297/2017. Linia rosie din cadrul Documentatiei de Atribuire nu respecta prevederile 1296/2017 si pe cale de consecinta, nici recomandarile Auditului de Siguranta Rutiera. Va rugam sa confirmati faptul ca la nivelul ofertei tehnice linia rosie poate fi modificata in vederea respectarii legislatiei in vigoare.
Raspuns 79	In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor Oferte tehnice si Oferte financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia de Atribuire si Cerintele Beneficiarului. In situatia in care apar costuri suplimentare urmare a implementarii recomandarilor din ASR, ca urmare a solicitarii Supervizorului si Beneficiarului, se pot accesa rezervele de implementare sau alte sume disponibile in conformitate cu legislatia achizitiilor publice. In acest sens, aducem in vedere prevederile sectiunii II.2.11) *Informatii privind optiunile* din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti: *„In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii si/sau lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1.361.093.077 lei fara TVA (reprezentand 20% din Valoarea estimata de contract fara rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii/lucrari similare) este de 8.847.104.999 Lei, fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”* Totodata, sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul Contractual.

	De asemenea, precizam faptul ca in cazul in care, ulterior semnarii contractului, se impun modificari punctuale de linie rosie, eventualele exproprieri suplimentare si revizuirea Acordului de Mediu vor intra in sarcina viitorului Antreprenor. Intr-o atare situatie riscurile aferente se vor trata cu respectarea prevederilor 12.35.2 – *Riscuri* din Cerintele Beneficiarului, ale Clauzei 68. *Riscuri, alocarea riscurilor și despăgubiri* din HG nr. 1/2018 precum si cu respectarea prevederilor sub-clauzei 8.4 si 8.5 din acelasi act normativ: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* Cuantificarea riscurilor se va face prin Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 69c din HG nr. 1/2018, si/sau prin Hotararile Instantelor judecatoresti, dupa caz.
Intrebare 96	Pe traseul sectiunii 3B3, la aproximativ km 31+700, ampriza lucrarilor se află în afara limitei de expropriere, dupa cum sa poate vedea mai jos. Va rugam sa clarificati.

	
Raspuns 96	La acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. Astfel, Lucrarile proiectate in cadrul viitorului Contract se vor incadra, pe cat posibil din punct de vedere tehnic, in coridorul de expropriere aferent Studiului de fezabilitate pentru care la acest moment a fost finalizata procedura de expropriere. In conditiile in care, daca ulterior semnarii contractului, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie se constata faptul ca din punct de vedere tehnic este imposibila respectarea coridorului de expropriere initial de la faza de Studiu de fezabilitate, iar solutiile tehnice proiectate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, insotite de justificarile pertinente aferente demonstreaza in mod corespunzator aceasta imposibilitate, se vor aplica mecanismele contractuale si legale incidente. Totodata, precizam faptul ca, in cazul în care apar situații care necesită suprafețe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerințele Beneficiarului si Anexei nr.2 la Cerințele Beneficiarului-Suprafețe de teren suplimentare necesare execuției lucrarilor: *Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.* *Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului și doar cu acordul expres al Beneficiarului.* *In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie și/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].* Astfel, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii

	economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare. De asemenea, se vor aplica in mod corespunzator si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).*
Intrebare 98	Suprapunand lucrarile ce fac obiectul contractului cu limita de expropriere pusa la dispozitie de catre Beneficiar, am observat ca:

	□ Centrul de monitorizare și intervenție pentru tuneluri și o porțiune din ampriza portalului între km 34+300 și km 34+350 sunt în afara limitelor exproprierii; □ Centrul de monitorizare și intervenție pentru tuneluri și o porțiune din ampriza portalului între km 37+150 și km 37+075 sunt în afara limitelor exproprierii. In masura in care limita de expropriere constituie cerinta imperativa iar lucrarile nu se incadreaza in aceasta, va rugam sa clarificati modul in care se va proceda la intocmirea ofertei.
Raspuns 98	La acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. Astfel, lucrarile proiectate in cadrul viitorului Contract se vor incadra, pe cat posibil din punct de vedere tehnic, in coridorul de expropriere aferent Studiului de fezabilitate pentru care la acest moment a fost finalizata procedura de expropriere. In conditiile in care, daca ulterior semnarii contractului, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie se constata faptul ca din punct de vedere tehnic este imposibila respectarea coridorului de expropriere initial de la faza de Studiu de fezabilitate, iar solutiile tehnice proiectate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, insotite de justificarile pertinente aferente demonstreaza in mod corespunzator aceasta imposibilitate, se vor aplica mecanismele contractuale si legale incidente. Astfel, in cazul în care apar situații care necesită suprafețe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerințele Beneficiarului si Anexei nr.2 la Cerințele Beneficiarului- Suprafețe de teren suplimentare necesare execuției lucrarilor. Mentionam, de asemenea, ca locatia Centrului de monitorizare si interventie pentru tunel ramane la latitudinea viitorului Antreprenor care va fi selectat din cadrul operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului: **5.6.1. CENTRU DE MONITORIZARE ȘI INTERVENTIE pentru TUNELURI** *Antreprenorul este responsabil de proiectarea și executia unui Centru de monitorizare și interventie pentru tunel; Antreprenorul va fi responsabil de identificarea amplasamentului acestui Centru de monitorizare și interventie, astfel incat sa fie asigurata respectarea cerintelor de siguranta pentru toate tunelurile; totodata, Antreprenorul va analiza pozitionarea acestui Centru de monitorizare și interventie in tunel/in vecinatatea tunelurilor. Acesta va fi amplasat in imediata apropiere a tunelurilor, astfel incat interventia cu echipamentele/ utilajele/ autovehiculele specifice sa fie imediata.* *Se va avea in vedere colaborarea cu partile implicate – exemplu: Politia Romana, Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul pentru situatii de urgenta, SMURD, s.a.* **Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare, pe baza carora nu se pot efectua verificarile necesare pentru a confirma/infirma ipoteza operatorului economic, in vederea elaborarii unor oferte complete corecte si comparabile, la momentul elaborarii acestora, locatia pentru CMI a fost lasata la latitudinea ofertantilor, cu conditia incadrarii in coridorul de expropriere initial, aferent Studiului de fezabilitate**. Astfel, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile

	legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare. De asemenea, se vor aplica in mod corespunzator si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* **A se vedea si Raspunsul nr. 199 din cadrul prezentei Clarificari.**
Intrebare 108	Fata de prevederile art. 5.5 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare] conform carora: *"Se va avea in vedere faptul ca in zona km 37+325 este o alunecare care afecteaza centura ocolitoare a orasului Zalau (se anexeaza dispozitia de santier aferenta lucrarilor de consolidare necesare stabilizarii alunecarii pentru Centura Ocolitoare)."* va rugam sa ne puneti la dispozitie date suplimentare referitoare la alunecare de teren, cu precadere:

	- daca pentru monitorizarea acesteia au fost instalate inclinometre si citirile acestora pana in prezent; - daca pentru monitorizarea nivelului apei freatice au fost instalate piezometre si citirile acestora pana in prezent; - plan de situatie cu conturul alunecarii si influenta asupra traseului autostrazii ce face obiectul acestei proceduri; - adancimea planului de alunecare, directia de alunecare si viteza de deplasare a alunecarii.
Raspuns 108	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile si documentele relevante pe care le detine pana la acest moment. Astfel, in cadrul Documentelor Beneficiarului a fost anexata dispozitia de santier din data de 01.11.2022 – a se vedea in acest sens folderul *DS ZALAU*, din cadrul documentatiei de atribuire publicata. Dat fiind faptul ca Expertiza tehnica mentionata in cadrul Dispozitiei de santier din 01.11.2022 nu a fost finalizata pana in prezent, la acest moment nu exista o certitudine ca sunt necesare anumite lucrarile de consolidare suplimentare in zona km 37+325 in cadrul prezentului Contract. Mentionam faptul ca lucrarile de consolidare prevazute in cadrul Dispozitiei de Santier din 01.11.2022 nu fac parte din obiectul prezentului Contract. Drept urmare, in cadrul ofertelor vor fi cuantificate doar lucrarile de consolidare prevazute in cadrul prezentei documentatii de atribuire si in mod special cele prevazute in cadrul Cerintelor Beneficiarului si ale Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. Se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii

	tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare.
Intrebare 109	Fata de prevederile art. 5.5 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare] conform carora: *"Se va avea in vedere faptul ca in zona km 37+325 este o alunecare care afecteaza centura ocolitoare a orasului Zalau (se anexeaza dispozitia de santier aferenta lucrarilor de consolidare necesare stabilizarii alunecarii pentru Centura Ocolitoare)."* si fata de textul Dispozitiei de Santier potrivit caruia: *"Pe parcursul executiei excavatie pentru descarcarea versantului din amonte de lucrarea de sprijinire, se va elabora o Expertiza Tehnica pentru stabilirea masurilor de interventie din etapele ulterioare descarcarii versantului"*. va rugam sa clarificati daca aceasta expertiza tehnica a fost intocmita, iar in masura in care Autoritatea Contractanta este in posesia acesteia (avand in vedere data dispozitiei - 01.11.2022), va rugam sa o puneti la dispozitia ofertantilor.
Raspuns 109	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile si documentele relevante pe care le detine pana la acest moment. Astfel, in cadrul Documentelor Beneficiarului a fost anexata dispozitia de santier din data de 01.11.2022 – a se vedea in acest sens folderul *DS ZALAU*, din cadrul documentatiei de atribuire publicata. Dat fiind faptul ca Expertiza tehnica mentionata in cadrul Dispozitiei de santier din 01.11.2022 **<u>nu a fost finalizata pana in prezent</u>**, la acest moment nu exista o certitudine ca sunt necesare anumite lucrarile de consolidare suplimentare in zona km 37+325 in cadrul prezentului Contract. Mentionam faptul ca lucrarile de consolidare prevazute in cadrul Dispozitiei de Santier din 01.11.2022 nu fac parte din obiectul prezentului Contract. Drept urmare, in cadrul ofertelor vor fi cuantificate doar lucrarile de consolidare prevazute in cadrul prezentei documentatii de atribuire si in mod special cele prevazute in cadrul Cerintelor Beneficiarului si ale Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. Se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul*

	Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință. *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5** Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare.
Intrebare 110	Fata de prevederile art. 5.5 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative privind lucrarile de consolidare] conform carora: *"Se va avea in vedere faptul ca in zona km 37+325 este o alunecare care afecteaza centura ocolitoare a orasului Zalau (se anexeaza dispozitia de santier aferenta lucrarilor de consolidare necesare stabilizarii alunecarii pentru Centura Ocolitoare)."* si fata de textul Dispozitiei de Santier potrivit caruia: *"Dupa executia penetrarilor dinamice se va realiza cate un sondaj deschis pentru fiecare tronson de zid afectat de*

	alunecarea de teren pentru stabilirea cotei unde a avut loc cedarea pilotilor forati si identificarea degradarilor acestora;" Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor incercarile / testele efectuate si rezultatele acestora, plan de situatie cu amplasarea lor, precum si orice alte informatii suplimentare au devenim disponibile intre data dispozitiei de santier, i.e. 01.11.2022 si data prezenta.
Raspuns 110	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile si documentele relevante pe care le detine pana la acest moment. Astfel, in cadrul Documentelor Beneficiarului a fost anexata dispozitia de santier din data de 01.11.2022 – a se vedea in acest sens folderul *DS ZALAU,* din cadrul documentatiei de atribuire publicata. Dat fiind faptul ca Expertiza tehnica mentionata in cadrul Dispozitiei de santier din 01.11.2022 nu a fost finalizata pana in prezent, la acest moment nu exista o certitudine ca sunt necesare anumite lucrarile de consolidare suplimentare in zona km 37+325 in cadrul prezentului Contract. Mentionam faptul ca lucrarile de consolidare prevazute in cadrul Dispozitiei de Santier din 01.11.2022 nu fac parte din obiectul prezentului Contract. Drept urmare, in cadrul ofertelor vor fi cuantificate doar lucrarile de consolidare prevazute in cadrul prezentei documentatii de atribuire si in mod special cele prevazute in cadrul Cerintelor Beneficiarului si ale Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. Se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod

	corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare.
Intrebare 120	Avand in vedere ca am identificat de-a lungul culoarului de autostradă al Lotului 3B3, zone in care lucrarile prevazute a fi executate se află în afara limitei de expropriere primite, de exemplu i) la aproximativ Km. 31 + 700, ii) in cazul Centrului de monitorizare și intervenție pentru tuneluri" și iii) o porțiune din amprenta portalului între km 34+300 și km 34+350. Va solicitam sa clarificati situatia acelor lucrari, de tipul celor indicate ca exemplu in intrebarea noastra care nu se incadreaza in limita coridorului de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar. In acest sens, va solicitam sa confirmati ca pentru toate solutiile proiectate care respecta Cerintele Beneficiarului, si care nu se incadreaza in limita coridorului de expropriere pus la dispozitie, raspunderea pentru depasirea acestei limite apartine Beneficiarului. Aceasta solicitare este in conformitate si cu prevederile punctului 5.1.19. din Cerintele Beneficiarului care prevad ca Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare doar in doua situatii, respectiv: in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Subclauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].
Raspuns 120	La acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. Astfel, Lucrarile proiectate in cadrul viitorului Contract se vor incadra, pe cat posibil din punct de vedere tehnic, in coridorul de expropriere aferent Studiului de fezabilitate pentru care la acest moment a fost finalizata procedura de expropriere. In conditiile in care, daca ulterior semnarii contractului, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie se constata faptul ca din punct de vedere tehnic este imposibila respectarea coridorului de expropriere initial de la faza de Studiu de fezabilitate, iar solutiile tehnice proiectate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, insotite de justificarile pertinente aferente demonstreaza in mod corespunzator aceasta imposibilitate, se vor aplica mecanismele contractuale si legale incidente. **Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare, pe baza carora nu se pot efectua verificarile necesare pentru a confirma/infirma ipoteza operatorului economic, in vederea elaborarii unor oferte complete corecte si comparabile, la momentul elaborarii acestora, lucrarile ce urmeaza a fi proiectate si executate se vor incadra in coridorul de expropriere initial, aferent Studiului de fezabilitate**.

Prin urmare, precizam faptul ca, in cazul în care apar situații care necesită suprafețe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerințele Beneficiarului si Anexei nr.2 la Cerințele Beneficiarului-Suprafețe de teren suplimentare necesare execuției lucrarilor:
Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 2 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.
Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului și doar cu acordul expres al Beneficiarului.
In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 2 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie și/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].

Astfel, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.
Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.
De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare.

De asemenea, se vor aplica in mod corespunzator si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018:
8.4 *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau*

	altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință. *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5** Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).*
Intrebare 161	În „Cerințele Beneficiarului", secțiunea 5.5 „Caracteristici imperative privind lucrările de consolidare", se menționează că o alunecare de teren afectează centura de ocolire a orașului Zalău în zona km: 37+325, unde au fost împărtășite schița lucrărilor de consolidare și un document de „dispunere a amplasamentului": Se va avea in vedere faptul ca in zona km 37+325 este o alunecare care afecteaza centura ocolioare a Orasului Zalau (se anexeaza dipozitia de santier aferenta lucrarilor de consolidare necesare stabilizarii alunecarii pentru Centura Ocolitoare). Din informațiile și datele relevante se înțelege că proiectarea lucrărilor de consolidare pentru stabilizarea alunecării de teren a fost deja pregătită. Vă rugăm să clarificați care va fi responsabilitatea ofertanților pentru alunecarea de teren relevantă și dacă este nevoie de orice proiectare / considerație suplimentară în afară de soluția de consolidare partajată. De asemenea, în documentul "Formulare – Prețurile activităților/ Categoriilor de lucrări sau servicii" nu sunt specificate elementele lucrărilor de consolidare pentru alunecarea de teren. De asemenea, vă rugăm să clarificați dacă elementele lucrărilor de consolidare pentru alunecări de teren vor fi incluse în rubrica 12.11 alte lucrări de consolidare necesare realizării Subsectiilor 3B3.
Raspuns 161	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate informatiile si documentele relevante pe care le detine pana la acest moment. Astfel, in cadrul Documentelor Beneficiarului a fost anexata dispozitia de santier din data de 01.11.2022 – a se vedea in acest sens folderul *DS ZALAU*, din cadrul documentatiei de atribuire publicata. Dat fiind faptul ca Expertiza tehnica mentionata in cadrul Dispozitiei de santier din 01.11.2022 nu a fost finalizata pana in prezent, la acest moment nu exista o certitudine ca sunt necesare anumite lucrarile de consolidare suplimentare in zona km 37+325 in cadrul prezentului Contract. Mentionam faptul ca lucrarile de consolidare prevazute in cadrul Dispozitiei de Santier din 01.11.2022 **nu fac parte din obiectul prezentului Contract**. Drept urmare, in cadrul ofertelor **vor fi cuantificate doar lucrarile de consolidare prevazute in cadrul prezentei documentatii de atribuire si in mod special cele prevazute in cadrul Cerintelor Beneficiarului si ale Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7**. Se vor aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018:

	8.4 *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare.
Intrebare 170	Avand in vedere ca in cadrul profilelor transversale tip de debleu nu sunt prevăzuți Parapeti, iar la marginea platformei este prevazuta o rigola cu descarcare in camin, va rugam sa ne

	transmiteti daca este posibila inlocuirea acesteia cu o rigola de acostament, respectiv sant la baza platformei.
Raspuns 170	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca este permisa inlocuirea rigolei cu descarcare in camin cu rigola de acostament (sant la baza platformei), in zonele de debleu.
Intrebare 181	In cadrul capitolului 5.3.2 din Cerintele Beneficiarului sunt prezentate in tabelul privind caracteristicile imperative ale structurilor, denumirea, pozitia kilometrica si numarul de deschideri/lungimea acestora, precum si lungimea totala a structurii. Va rugam sa ne transmiteti daca sunt permise modificari ale structurilor privind: • Tipul de fundatie • Tipul de suprastructura (beton, tablier, etc.) • Forma si geometria grinzilor • Numarul grinzilor in sectiune • Modificarea numarului de deschideri si ale lungimilor acestora
Raspuns 181	Este permisa modificarea doar a formei, geometriei grinzilor si numarul grinzilor in sectiune. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, **nu sunt permise** modificări privind tipul de fundatie, tipul de suprastructura, numarul de deschideri si lungimea acestora pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului. Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va respecta *Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor* cuprinse in Cerintele Beneficiarului - ***5.3. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor.*** In ceea ce priveste decizia Autoritatii Contractante privind delimitarea aspectelor care trebuie respectate si a celor a caror modificare este permisa, precizam urmatoarele: Autoritatea Contractanta a stabilit Cerintele Imperative ale structurilor inca din data de 09.02.2023, la cap. 5.5 din Cerintele Beneficiarului, stipulandu-se in mod clar: ***5.3. Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor*** ***5.3.1.*** *Proiectarea va avea ca referinta Eurocodurile, Normele şi Standardele in vigoare conform sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale;* *a) Structurile prevazute pe autostrada vor fi alcatuite din doua structuri indepedente, cate unul pentru fiecare sens de circulatie.* ***Se va pastra tipul suprastructurii din Documentatia Tehnica****. [...]* De asemenea, la cap. 5.3.2 - Structuri - imperative din Cerintele Beneficiarului au fost prevazute Numarul deschiderilor si Lungimea suprastructurii. Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului la punctul **3.8. Lucrari de poduri, pasaje și viaducte**, Autoritatea Contractanta a prevazut tipul de fundatie (directa/indirecta) pentru fiecare dintre lucrarile de arta care vor fi construite in cadrul viitorului tronson de autostrada. Astfel, Autoritatea Contractanta si-a stabilit prin documentatia de atribuire propriile necesitati si anumite parti din Studiul de fezabilitate au fost preluate ca Cerinte ale Beneficiarului fiind in deplina legalitate un astfel de demers si in concordanta cu practica unitara a autoritatilor contractante si legislatia in vigoare. In conditiile in care Autoritatea Contractanta ar lasa la latitudinea ofertantilor **aspectele esentiale ale solutiilor tehnice pentru structuri** s-ar genera un blocaj in cursul procesului de

	evaluare, trebuind analizata fiecare solutie alternativa propusa de fiecare dintre ofertanti si **nu s-ar mai putea compara ofertele**. Mai mult, Autoritatea Contractanta a indicat in mod expres in cadrul documentatiei de atribuire ca nu este permisa depunerea de oferte alternative, conform sectiunii II.2.10 din Instructiunile catre Ofertanti - *Informatii privind variantele:* ***Vor fi acceptate variante: Nu.*** Insa, avand in vedere specificul tipului de contract de proiectare si executie, cat si caracterul informativ al Studiului de Fezabilitate, Autoritatea Contractanta a lasat la latitudinea ofertantilor o serie de aspecte cu privire la care se poate accepta propunerea propriilor solutii, aceste situatii fiind analizate de la caz la caz, in functie de necesitatile Autoritatii Contractante. Autoritatea Contractanta a mentionat clar in raspunsul la solicitarea de clarificare faptul ca doar la **momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare pentru a avea oferte competitive si comparabile nu sunt permise modificari/oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului cu privire la aspecte esentiale ale solutiilor tehnice adoptate in privinta structurilor.** Totodata, Autoritatea Contractanta a avut in vedere faptul ca Antreprenorul are si rol de Proiectant, iar in conformitate cu prevederile HG 907/2016 „*Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia* ***prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii****; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare",* si prin urmare a lasat la latitudinea ofertantilor din randul carora va fi selectat viitorul Antreprenor anumite solutii tehnice punctuale, precum *forma, geometria grinzilor si numarul grinzilor in sectiune.* Astfel, Studiul de fezabilitate are un caracter informativ cu excepția acelor părți din el care au fost stabilite de Autoritatea Contractanta ca cerință imperativă in Cerintele Beneficiarului. Caracteristicile imperative ale Lucrărilor reprezintă acea parte din Cerințele Beneficiarului care nu poate fi modificată (fără acordul acestuia), exceptie facand erorile de proiectare. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de **„*proiectant*”,** așa cum este el definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante, avand in vedere faptul ca Studiul de fezabilitate este elaborat cu respectarea rigorilor normativelor in vigoare la momentul elaborarii sale, riscurile sunt impartite conform HG nr. 1/2018 si Cerintelor Beneficiarului, iar prin documentatia de atribuire s-au stabilit caracteristicile imperative si cele pentru care pot fi acceptate propuneri din partea ofertantilor. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli suplimentare, se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual.

	Raportat la cele precizate consideram relevante si prevederile Deciziei CNSC nr. 272/C4/2886/03.02.2023, care in cadrul unei spete identice a retinut urmatoarele: *Consiliul reţine că răspunsul autorităţii contractante este clar, în sensul că **nu se pot prezenta în ofertă soluţii diferite de cele prevăzute în studiul de fezabilitate, soluţia fiind perfect logică**. De asemenea, Consiliul remarcă şi **caracterul general, abstract, al criticilor formulate de contestatoare aceasta nearătând în concret motivul pentru care consideră că soluţiile tehnice propuse în studiul de fezabilitate ar fi eronate**, necesitând schimbarea lor.* *Prin urmare, Consiliul reţine că **autoritatea contractantă este singura în măsură să stabilească specificaţiile tehnice care să ofere operatorilor economici toate informaţiile necesare pentru întocmirea unor oferte comparabile**, în condiţii de egalitate şi transparenţă.* *Consiliul mai reţine ca relevante şi dispoziţiile art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice potrivit căruia ,,(1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/ opţiuni tehnico - economice diferite, **recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. [...]*** *Contestatoarea **nu prezintă niciun argument pentru care studiul de fezabilitate ar conţine scenarii/opţiuni tehnico-economice eronate care ar trebui schimbate**, fiind greu de acceptat că doar prin simpla citire a documentaţiei de atribuire operatorul a sesizat vicii ale acesteia care ar face improprii scenariile propuse.* *Consiliul reţine, astfel, că **DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ESTE OBLIGATORIE PENTRU OPERATORII ECONOMICI ÎN ETAPA ÎNTOCMIRII OFERTELOR**.* *Consiliul mai reţine că operatorul declarant câştigător are posibilitatea de optimizare a soluţiilor din studiul de fezabilitate, în faza elaborării proiectului, dacă se constată motivat şi justificat tehnic, că scenariile propuse au erori. Dar această optimizare are loc, aşa cu s-a arătat, în etapa realizării proiectului, şi nu a ofertelor, aceasta fiind posibilă pe baza informaţiilor suplimentare obţinute de proiectant în această etapă.* *Prin urmare, **nu există niciun motiv legal sau tehnic care să permită ofertanţilor, în etapa realizării ofertelor, să schimbe scenariul/opţiunea tehnico-economică, respectiv soluţiile tehnice din studiul de fezabilitate, tipul structurilor, caracteristicile podurilor** etc, mai cu seamă că în etapa evaluării ofertelor, nu pot fi validate de o comisie de evaluare noile soluţii, şi, mai cu seamă, ofertele nu pot fi comparate. O comisie de evaluare nu are posibilitate nici legală şi nici din punct de vedere al competenţelor sale, să accepte alte scenarii sau soluţii tehnice în cadrul ofertelor, în condiţiile în care există, deja, un studiu de fezabilitate complex.* *Prin urmare, **Consiliul nu observă abateri de la lege în formularea răspunsurilor, acestea fiind deosebit de clare, în sensul că operatorul nu are dreptul de a propune scenarii proprii în etapa realizării ofertei, ci acestea trebuie să respecte documentaţia de atribuire**."*
Intrebare 183	Va rugam sa ne transmiteti daca Ofertantul trebuie sa identifice amplasamentul pentru Centrul de monitorizare si interventie pentru tuneluri, conform Anexei nr. 6 la Cerintele Beneficiarului, in cadrul coridorului de expropriere, sau daca pot fi identificate posibile locatii (mai potrivite din punct de vedere al suprafetelor si amplasarii) si in afara coridorului de expropriere.

Raspuns 183	La acest moment, terenurile care fac obiectul coridorului de expropriere aferent Studiului de Fezabilitate au fost expropriate integral. Astfel, lucrarile proiectate in cadrul viitorului Contract se vor incadra, pe cat posibil din punct de vedere tehnic, in coridorul de expropriere aferent Studiului de fezabilitate pentru care la acest moment a fost finalizata procedura de expropriere. In conditiile in care, daca ulterior semnarii contractului, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie se constata faptul ca din punct de vedere tehnic este imposibila respectarea coridorului de expropriere initial de la faza de Studiu de fezabilitate, iar solutiile tehnice proiectate in cadrul Proiectului Tehnic de Executie, insotite de justificarile pertinente aferente demonstreaza in mod corespunzator aceasta imposibilitate, se vor aplica mecanismele contractuale si legale incidente. Astfel, in cazul în care apar situații care necesită suprafețe de teren suplimentare, se vor aplica prevederile art. 5.1.19 din Cerințele Beneficiarului si Anexei nr.2 la Cerințele Beneficiarului- Suprafețe de teren suplimentare necesare execuției lucrarilor. Mentionam, de asemenea, ca locatia Centrului de monitorizare si interventie pentru tunel ramane la latitudinea viitorului Antreprenor care va fi selectat din cadrul operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului: **5.6.1. CENTRU DE MONITORIZARE ȘI INTERVENTIE pentru TUNELURI** *Antreprenorul este responsabil de proiectarea și executia unui Centru de monitorizare și interventie pentru tunel; Antreprenorul va fi responsabil de identificarea amplasamentului acestui Centru de monitorizare și interventie, astfel incat sa fie asigurata respectarea cerintelor de siguranta pentru toate tunelurile; totodata, Antreprenorul va analiza pozitionarea acestui Centru de monitorizare și interventie in tunel/in vecinatatea tunelurilor. Acesta va fi amplasat in imediata apropiere a tunelurilor, astfel incat interventia cu echipamentele/ utilajele/ autovehiculele specifice sa fie imediata.* *Se va avea in vedere colaborarea cu partile implicate – exemplu: Politia Romana, Inspectoratul de Stat in Constructii, Inspectoratul pentru situatii de urgenta, SMURD, s.a.* **In vederea elaborarii unor oferte complete corecte si comparabile, la momentul elaborarii acestora, locatia pentru CMI a fost lasata la latitudinea ofertantilor, cu conditia incadrarii in coridorul de expropriere initial, aferent Studiului de fezabilitate**. Astfel, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii contractului sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia de Atribuire, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

	- parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 1.361.093.077 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) Informatii privind optiunile din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Pe cale de consecinta se vor aplica prevederile si mecanismele contractuale precum si prevederile legale in vigoare. De asemenea, se vor aplica in mod corespunzator si prevederile sub-clauzei 8.4 si 8.5 din HG nr. 1/2018: ***8.4*** *După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.* *După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.* ***8.5*** *Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptățit, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:* *(a) prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și* *(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%).* **A se vedea si Raspunsul nr. 199 din cadrul prezentei Clarificari.**
Intrebare 199	Va rugam sa comunicati ofertantilor daca este posibil ca Centrul de Monitorizare si Interventie pentru Tuneluri, sa fie organizat in Centrul de Intretinere si Coordonare, cu respectarea tuturor conditiilor specifice fiecarui Centru.
Raspuns 199	Daca Antreprenorul care are si rolul de Proiectant in cadrul viitorului contract si care va fi selectat din cadrul ofertantilor interesati de participarea la prezenta procedura, constata ca pot fi respectate toate conditiile din cadrul Cerintelor Beneficiarului (inclusiv cele prevazute la cap. 5.6.1.) Centrul de Monitorizare si Interventie pentru tuneluri poate fi amplasat in suprafata de teren destinata Centrului de Intretinere si Coordonare, cu conditia sa fie asigurata functionalitatea distincta a fiecaruia dintre cele doua tipuri de Centre si cu respectarea tuturor conditiilor specifice pentru fiecare Centru.
Intrebare 216	Solicităm cu amabilitate autorității contractante sa ne puna la dispozitie Expertiza Tehnică specificată în **Dispoziția de șantier nr 12/01.11.2022 pag 3 Punctul A paragraf 4 -Varianta**

	de ocolire Zalau.
Raspuns 216	Expertiza tehnica nu a fost finalizata pana la acest moment. A se vedea si Raspunsul nr. 109 din prezenta Clarificare.
